

令和2年度 緑化工施工 取りまとめ表

大山

施工日	期間 (日)	作業区分	苗木 (本)	対象面積 (㎡)	施工箇所	苗木(種)の種類
5月9日~13日 20日~21日	7	客土工		1,600	70ml~40ml	生育基盤改良
5月22日~23日	2	補充苗木植栽	400	650	50ml、40ml	アカメガシワ、アキグミ 各200本 シャリンバイ、トベラ ネズミモチ 各100本
5月24日	1	補充苗木植栽	300	950	70ml、60ml	
5月22日~24日	3	播種工	—	1,600	70ml~40ml	アカメガシワ、アキグミ シャリンバイ、トベラ ネズミモチ、ヤマハギ
大山合計		補充苗木植栽	700	1,600		
		播種工	—	1,600		

東山


施工日	期間 (日)	作業区分	苗木 (本)	対象面積 (㎡)	施工箇所	苗木(種)の種類
6月15日~16日	2	種子吹付	—	3,247	80ml~90ml	ケンタッキーブルーグラス パミューダグラス クリーピングレッドフェスク メドハギ ※コマツナギ、ヤマハギ
	2	増し吹き	—	11,953	80ml~90ml	
令和3年2月20日	1	補充苗木植栽	25	100	50ml~80ml	マツ
東山合計		種子吹付	—	3,247		うち、BSC工法 200㎡
		増し吹き	—	11,953		
		補充苗木植栽	25			

※草木類に加え試験的に在来先駆樹種や肥料木の種子を混ぜて吹き付ける。

大山+東山 合計	種子吹付	—	3,247	うち、BSC工法 200㎡
	増し吹き	—	11,953	
	苗木植え付け(本)	725	1,700	
	播種工	—	1,600	大山(70ml~40ml)

大山区域緑化施工位置図

S=1:3000

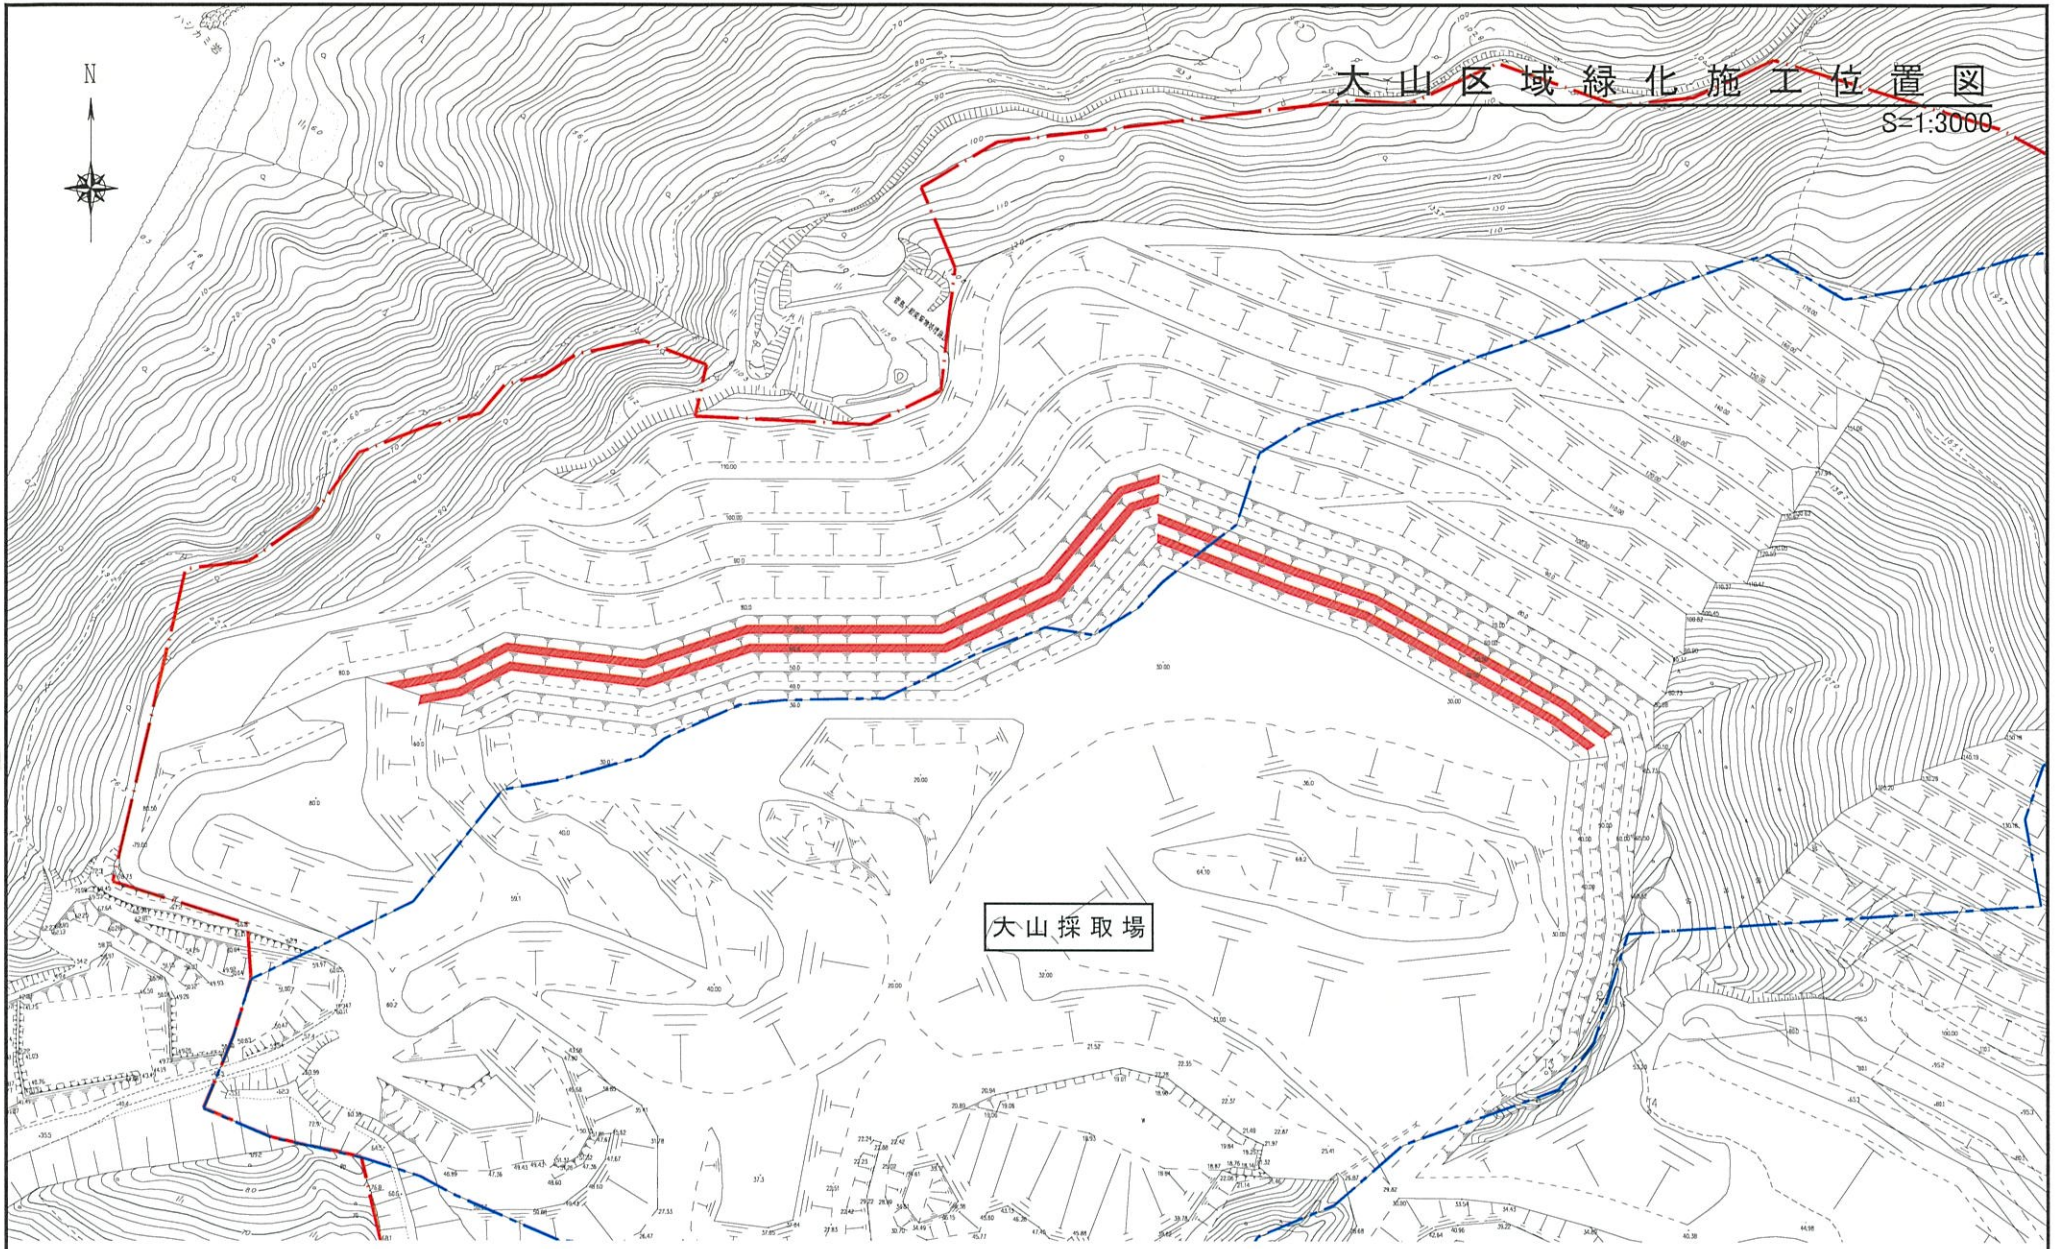

大山採取場


凡例

記号	名称	備考
 	事業区域	
 	429-67区域	鳥羽市
	苗木補充植栽施工範囲	

事業名	土石採取事業(砕石)	管島工場
図面名称	大山区域緑化施工位置図	
縮尺	1:3000	図面番号
承認	年月日	
鶴田石材株式会社		

東山区域緑化施工位置図

S-13000

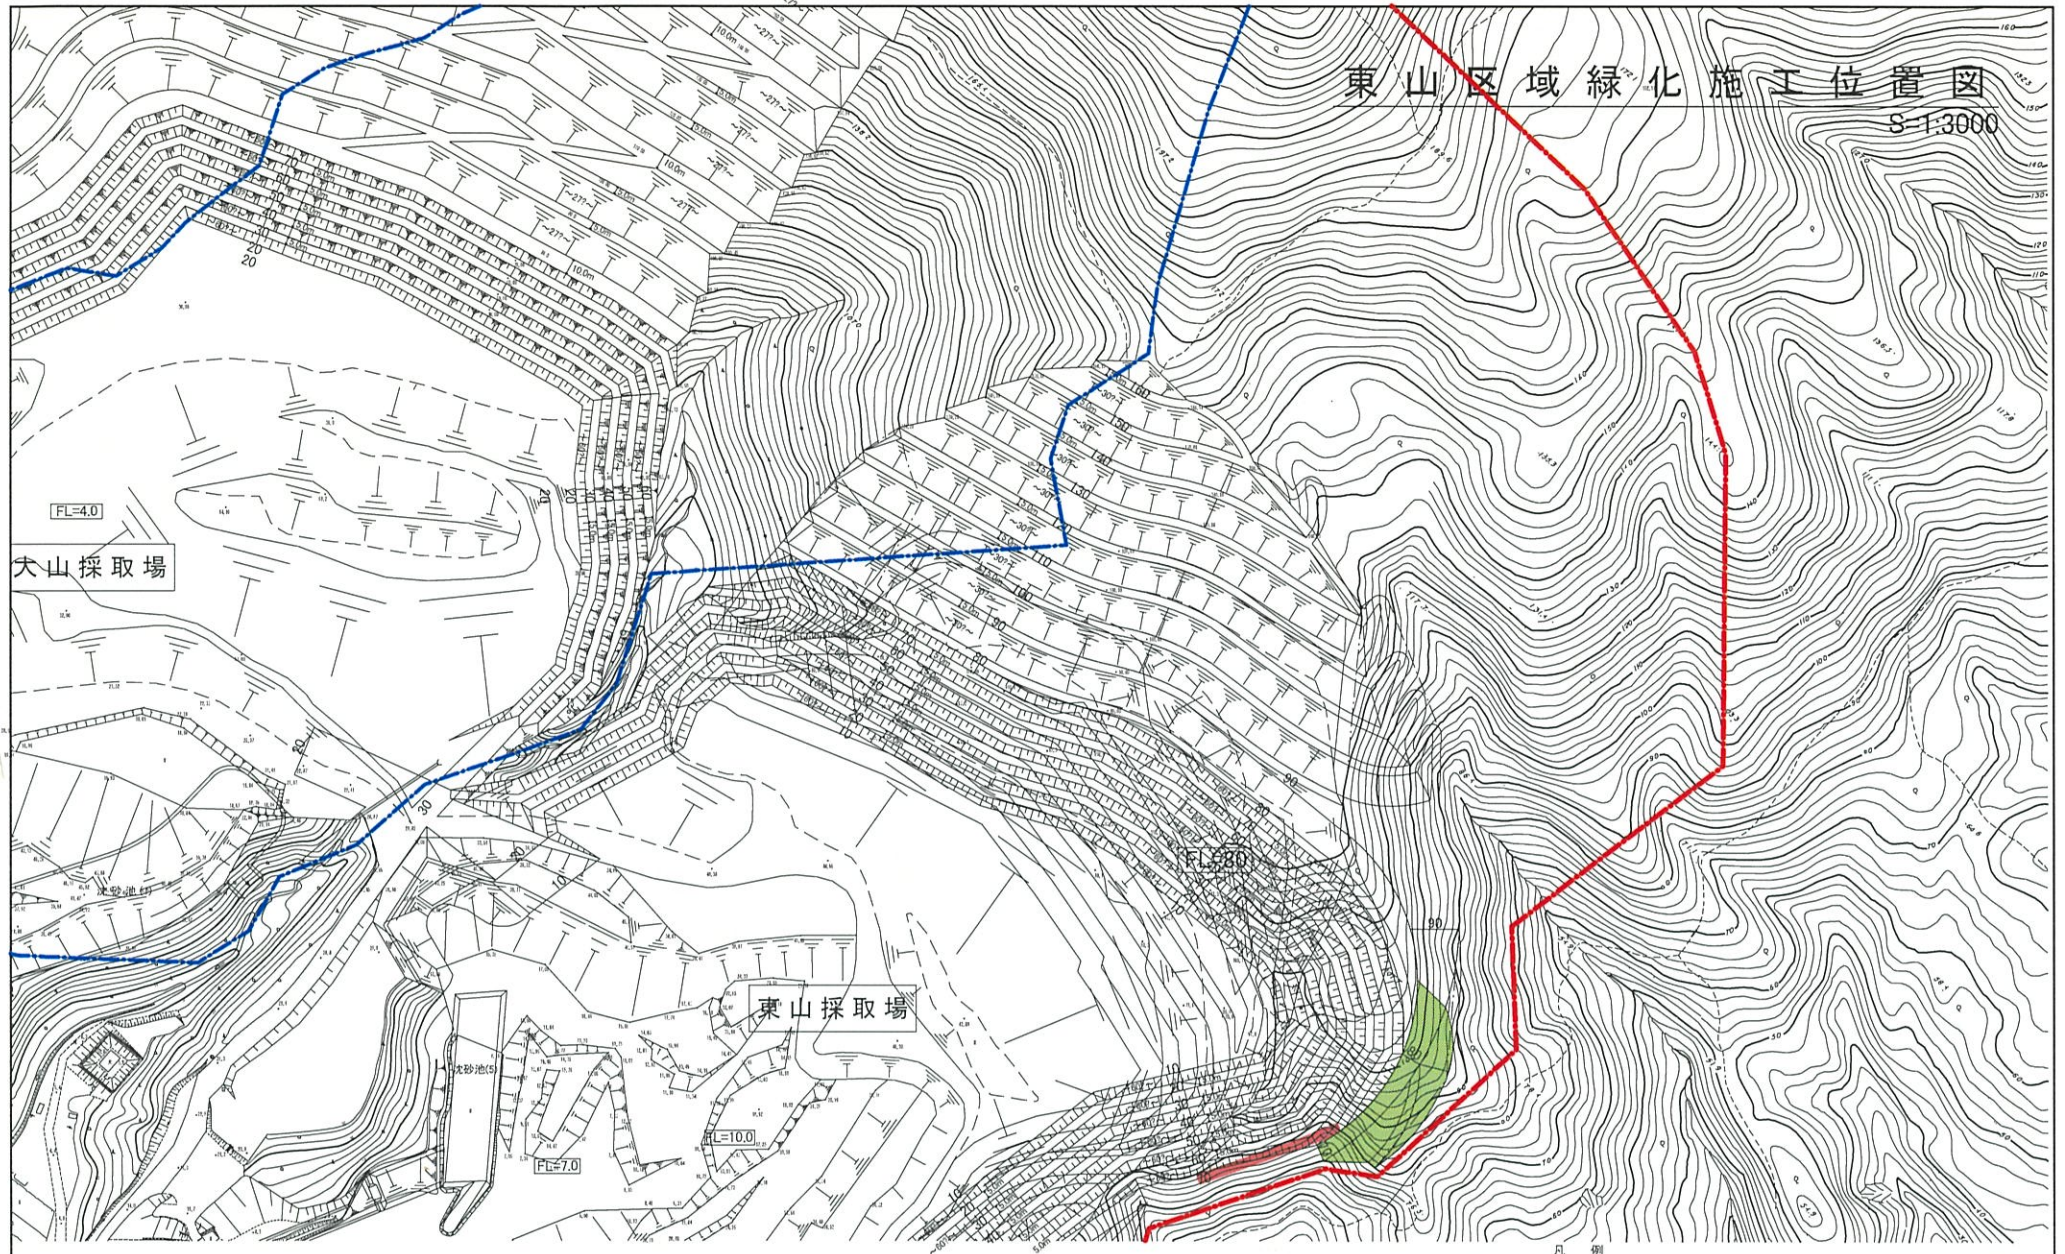

凡 例		
記号	名 称	備 考
	事業区域	
	429-67 区域	鳥羽市
	苗木植栽施行範囲	
	種子吹付施工範囲	

管島工場		
事業名	土石採掘事業(砕石)	
図面名称	東山区域緑化施工位置図	
縮 尺	1:3000	図面番号
承 認	年 月 日	
鶴田石材株式会社		

生育基盤改良状況写真

施工日 令和2年 5月9日～13日
5月20日～21日

施工区域 大山 70m l ・ 60m l
50m l ・ 40m l



No.1

大山 70m l 小段
生育基盤改良前



No.2

大山 70m l 小段
生育基盤改良施工後

・大山 60m I



No.1

大山 60m I 小段



No.2

大山 60m I 小段

生育基盤改良施工後



No.3

大山 70m I ・ 60m I

生育基盤改良施工後

全体写真

苗木植栽 種類

施工日 令和2年 5月22日～24日

施工区域 大山 70m | ・ 60m |
50m | ・ 40m |

状況写真

1、使用苗木

大山区域： トベラ、ネズミモチ、アカメガシワ、シャリンバイ、アキグミ



播種工

施工日 令和2年 5月22日～24日

施工区域 大山 70m l ・ 60m l
50m l ・ 40m l



No.1

ネズミモチ・アキグミ・シャリンバイ
トベラ・アカメガシワ・ヤマハギ



No.1

大山 70m l 小段 ヤマハギ

苗木植栽 実施状況

施工日 令和2年 5月22日～24日

施工区域 大山 70m l・60m l
50m l・40m l



No.1

70m l 小段

植栽状況写真



No.2

50m l 小段

植栽状況写真



No.1

70m | 小段

植栽終了状況写真



No.2

50m | 小段

植栽状況写真



No.3

40m | 小段

植栽終了状況写真

種子吹付工

施工日 令和2年 6月15日～16日

施工区域 東山 90m l ・ 80m l



No.1

吹付け工使用種子

ケンタッキーブルーグラス

クリーピングレッドフェスク

バミューダグラス

メドハギ コマツナギ

ヤマハギ



No.2

B S C 工法

① 藻株資材

② 藻類生育促進用



No.1

東山 90m l ・ 80m l

種子吹付工・B S C -1吹付



No.2

東山 90m l ・ 80m l

種子吹付工・B S C -1吹付



No.3

東山 90m l ・ 80m l

種子吹付工・B S C -1吹付

支柱立て作業

施工日 令和2年 6月13日・17日

施工区域 大山 70m l ・ 60m l
50m l ・ 40m l



No.1

60m l 小段

実施状況写真



No.2

70m l 小段

実施状況写真



No.3

70m l 小段

実施状況写真

令和2年度 灌水作業

施工日 5月～8月予定

施工区域 大山 70m l ・ 60m l

50m l ・ 40m l



マツ移植作業 ①

施工日 令和3年2月20日

施工区域 東山 50mI~80m I



No.1

マツ採取状況写真



No.2

マツ採取状況写真



No.3

マツ採取状況写真

マツ移植作業 ②

施工日 令和3年2月20日

施工区域 東山 50ml~80ml



No.1

マツ植栽 施工場所写真



No.2

マツ植栽状況写真



No.3

マツ植栽状況写真
