

## ① 令和元年度 緑化工取りまとめ表

## 大山

| 施工日        | 期間<br>(日) | 作業区分   | 苗木<br>(本) | 対象面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 施工箇所      | 苗木(種)の種類                                |
|------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------|---|
| 5月23日      | 1         | 客土工    | -         | -                         | 70ml、50ml | 生育基盤改良                                  |
| 5月25日      | 1         | 苗木補充植栽 | 100       | -                         | 70ml、50ml | アキグミ 苗木100本                             |
| 5月25日～6月1日 | 7         | 苗木補充植栽 | 213       | -                         | 70ml、50ml | ※マツ、トベラ、アカメガシワ<br>ネズミモチ、シャリンバイ          |
| 5月25日～27日  | 3         | 播種工    | -         | -                         | 70ml      | アカメガシワ、アキグミ<br>シャリンバイ、トベラ<br>ネズミモチ、ヤマハギ |
| 大山合計       |           | 苗木補充植栽 | 313       | -                         |           |   |

※苗木補充植栽に使用するマツ等は試験的に菅島に自生している樹木の移植を実施。

## 東山

| 施工日      | 期間<br>(日) | 作業区分   | 苗木<br>(本) | 対象面積<br>(m <sup>2</sup> ) | 施工箇所      | 吹付種子及び<br>苗木(種)の種類   |
|----------|-----------|--------|-----------|---------------------------|-----------|--|
| 6月27日    | 1         | 苗木補充植栽 | 6         | -                         | 50ml～60ml | ※マツ、トベラ、アカメガシワ   |
| 6月13日    | 2         | 種子吹付け  | -         | 20,000                    | 50ml～70ml | ケンタッキーブルーグラス<br>バミューダグラス<br>クレーピングレッドフェスク<br>メドハギ<br>※コマツナギ、ヤマハギ |
| 6月13日    | 1         | 播種工    | -         | -                         | 50ml～70ml | アカメガシワ、アキグミ<br>ヤマハギ、トベラ  |
| R2年2月12日 | 2         | 苗木補充植栽 | 15        |                           | 160ml     | ※マツ  |
| 東山合計     |           | 苗木補充植栽 | 21        | -                         |           |  |
|          |           | 種子吹付け  | -         | 20,000                    |           |  |

※苗木補充植栽に使用するマツ等は試験的に菅島に自生している樹木の移植を実施。

※草本類に加え試験的に在来先駆樹種や肥料木の種子を混ぜて吹き付ける。


※吹付施工前に播種工(撒布)を実施。

※小段各所の排水対策を行う。

|               |          |     |        |                                    |
|---------------|----------|-----|--------|------------------------------------|
| 大山 + 東山<br>合計 | 種子吹付け    | -   | 20,000 | 50ml～70ml                          |
|               | 種子・増し吹き  | -   | -      |                                    |
|               | 苗木植付け(本) | 334 | -      | 補充植栽・大山70ml,50ml、東山50ml～60ml,160ml |
|               | 播種工      | -   | -      | 50ml～70ml                          |

# 東山区域緑化施工位置図

S=1:3000

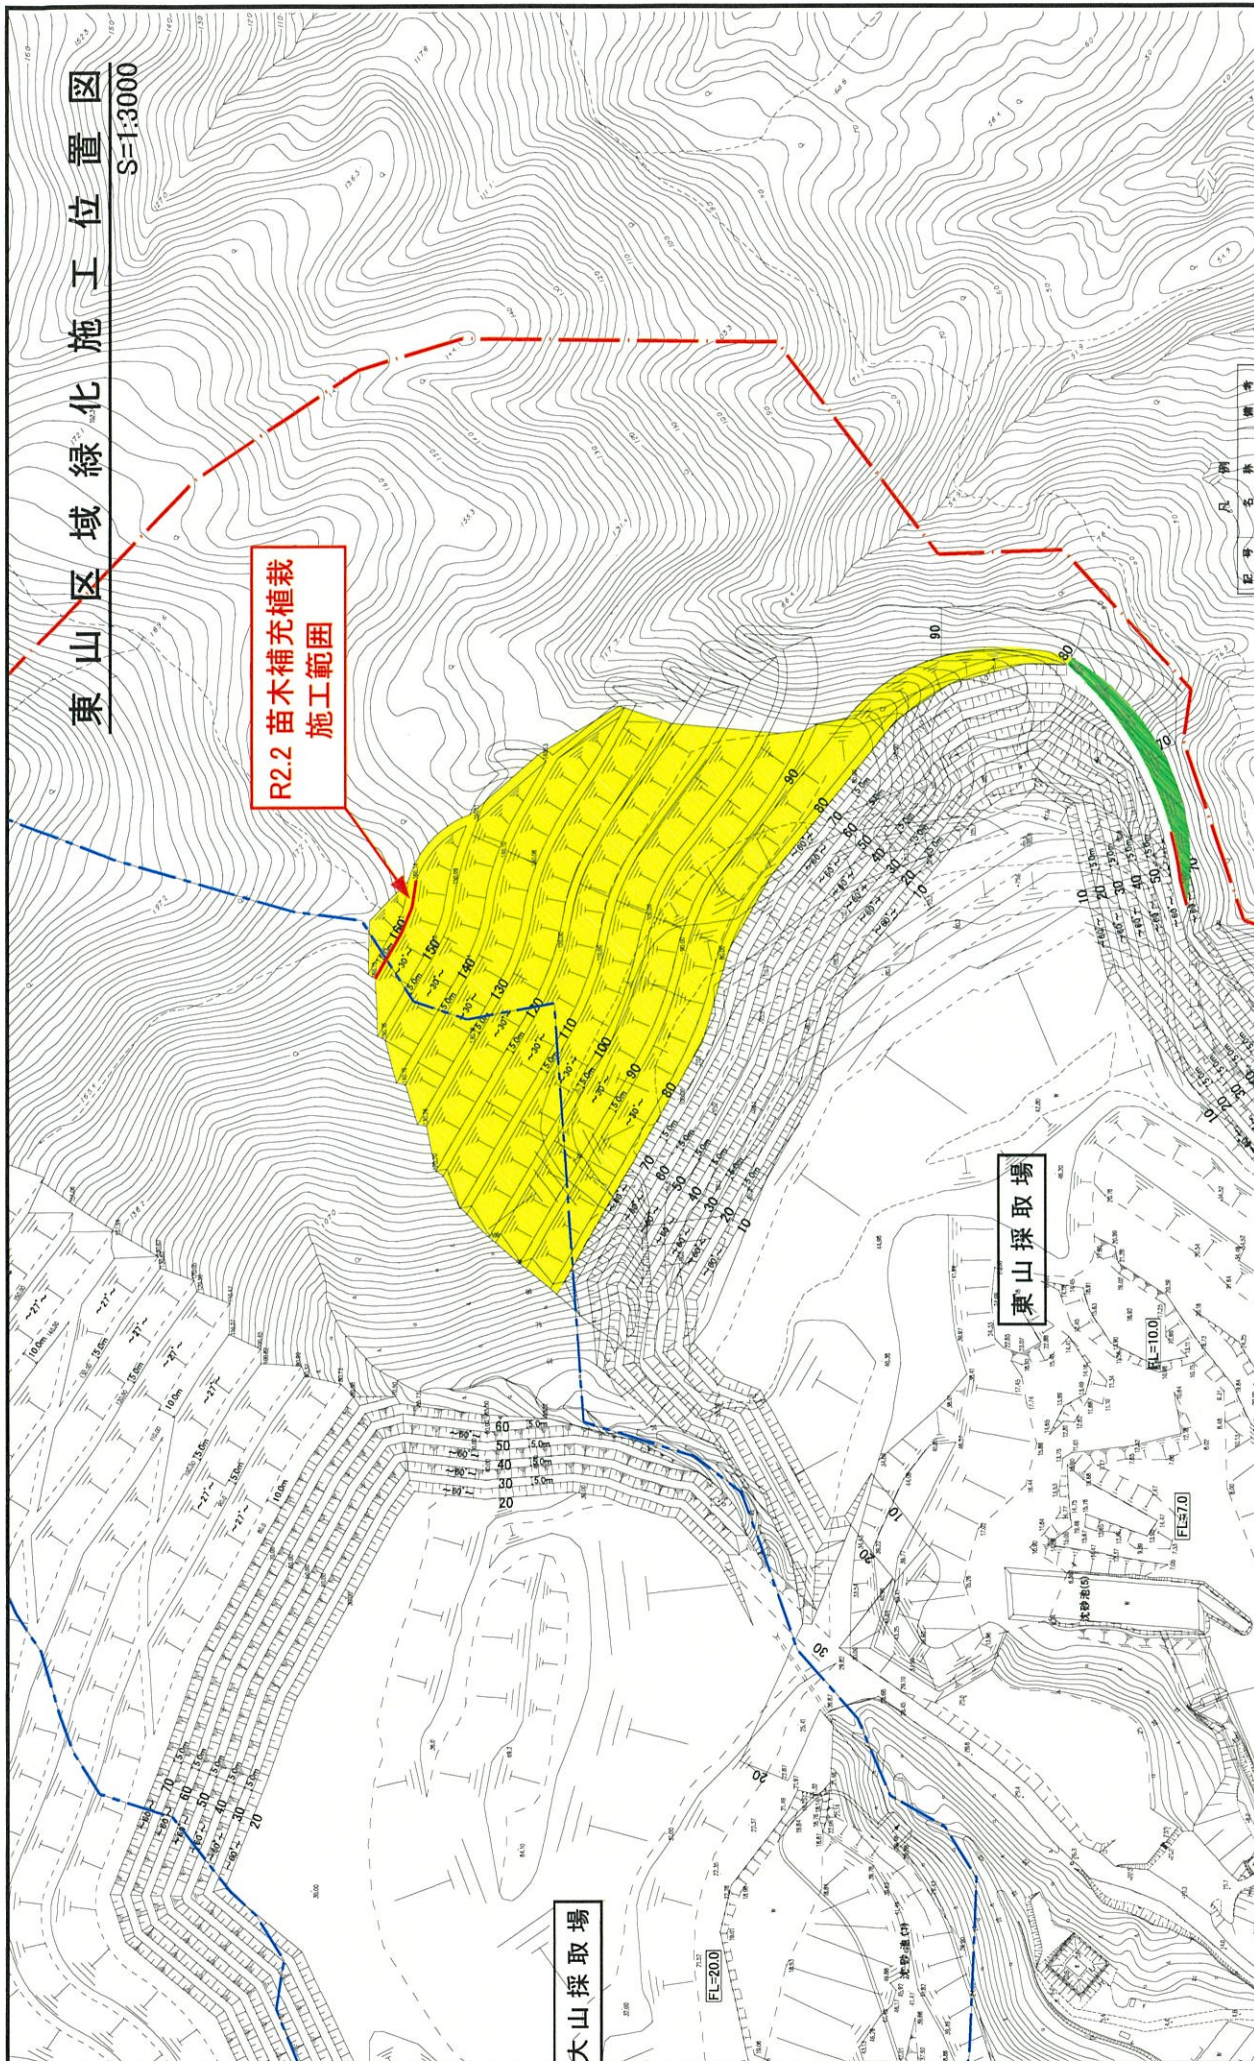

**R2.2 苗木補充植栽  
施工範囲**

大山採取場

東山採取場

| 記号                 | 名称                | 備考  |
|--------------------|-------------------|-----|
| [Red dashed line]  | 事業区域              | 鳥羽市 |
| [Blue dashed line] | 423-47区域          |     |
| [Yellow area]      | H20種子交付<br>施工範囲   |     |
| [Green area]       | R15種子交付<br>施工範囲   |     |
| [Red solid line]   | R16苗木補充植栽<br>施工範囲 |     |

| 製図工程 |             |
|------|-------------|
| 製図名  | 土石採取場等(採石)  |
| 製図名称 | 東山区域緑化施工位置図 |
| 縮尺   | 1:3000      |
| 承認   | 年 月 日       |
| 承認者  | 鶴田石材株式会社    |
